

北京市水务局

北京市水务局 关于 2018 年 1-11 月自备井置换和老旧小区 内部供水管网改造任务进展情况通报

各相关区政府，市自来水集团：


为加快落实市政府办公厅关于《加快推进自备井置换和老旧小区内部供水管网改造工作方案》确定的自备井置换和老旧小区内部供水管网改造工作任务，市水务局对 2018 年 1-11 月各区和市自来水集团承担的自备井置换和老旧小区内部供水管网改造工作进展情况进行了分析汇总，现通报如下：

一、总体任务进展情况

（一）自备井置换任务完成情况

2018 年全年计划完成自备井置换 269 个单位。1-11 月份，累计完成 288 个单位的自备井置换工作任务，占全年任务的 107%。其中，朝阳区完成 80 个，海淀区完成 48 个，丰台区完成 31 个，大兴区完成 62 个，石景山区完成 13 个，昌平区完成 20 个，通州区完成 34 个。


各区 1-11 月份任务完成率如下：

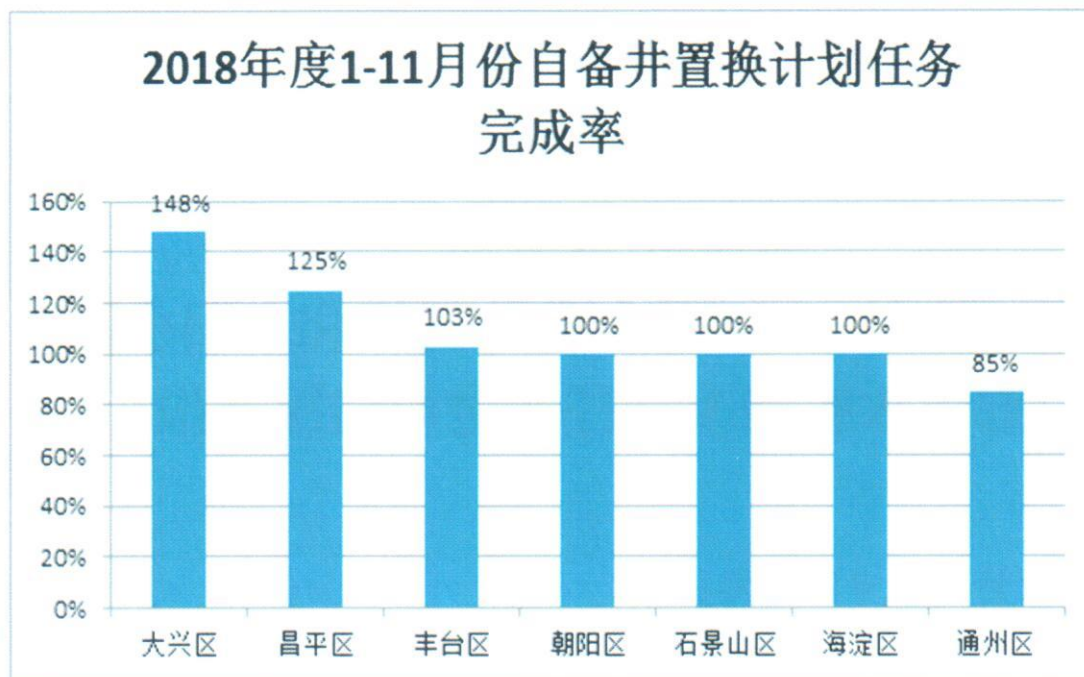

(二) 老旧小区内部供水管网改造任务完成情况

2018 年老旧小区内部供水管网改造工作任务 386 个。1-11 月份，累计完成老旧小区内部供水管网改造 392 个，任务完成率 102%。其中：东城区完成 23 个，西城区完成 53 个、通州区完成 40 个、朝阳区完成 102 个、海淀区完成 99 个、丰台区完成 31 个、大兴区完成 37 个、昌平区完成 6 个、石景山区完成 1 个。

各区 1-11 月份计划任务完成率如下：

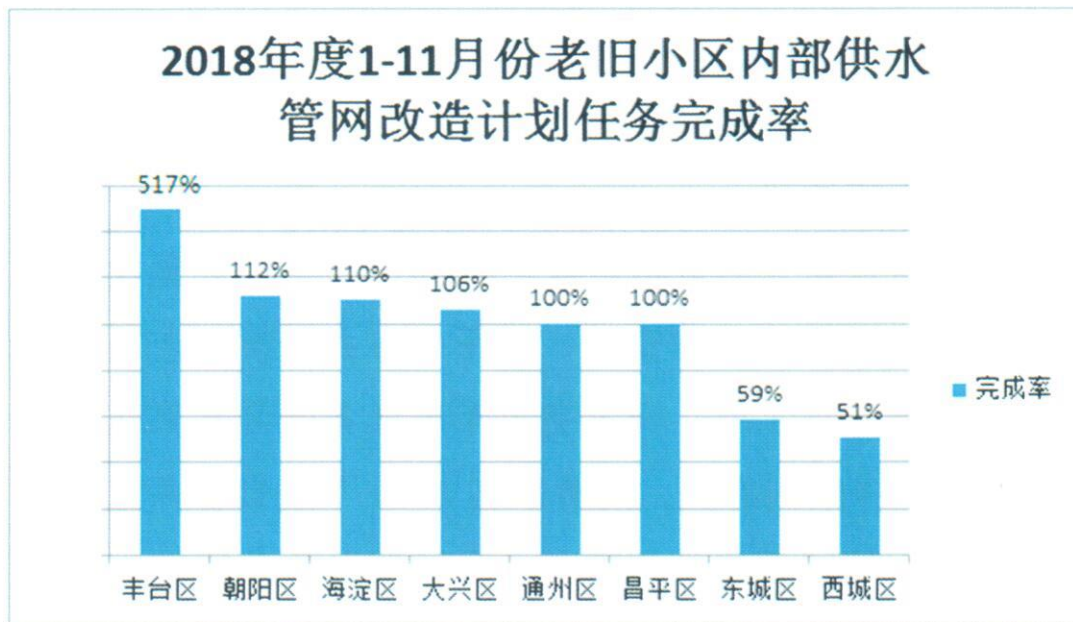

（三）自备井置换配套管线建设进展情况

由市自来水集团负责实施的自备井置换配套供水管线建设项目共 5 个。即：中心城区供水管网建设三期工程、中心城区供水管网建设四期工程、朝阳区供水管网完善工程、海淀区供水管网完善工程、丰台区供水管网完善工程。其中已确定建设规模 3 个项目，待确定建设规模 2 个项目。5 项工程实施工作进展情况如下：

1. 中心城区供水管网建设三期工程：供水管线总长 22.5 公里，前期手续全部完成，已累计完成管线建设 20.626 公里，完成率 91%。其中，11 月份完成管线建设 0 公里。

2. 中心城区供水管网建设四期工程：供水管线总长 25 公里，前期手续全部完成，已累计完成管线建设 8.854 公里，完成率 35%。其中，11 月份完成管线建设 0.288 公里。

3. 朝阳区供水管网完善工程：整体规模 17 公里，已取得“施工登记意见书”。

4. 海淀区供水管网完善工程：正在办理“设计方案审查意见函”。

5. 丰台区供水管网完善工程：正在办理“设计方案审查意见函”。

二、下一步工作建议

请相关区会同市自来水集团抓紧完善2018年自备井置换与老旧小区内部供水管网改造工作资料，做好自备井置换与老旧小区内部供水管网改造总结工作。尚未完成年度任务的区要采取有效措施，确保年度任务顺利完成。同时落实2019年度自备井置换和老旧小区内部供水管网改造计划任务，尽快明确任务明细，提前做好自备井置换单位的报装申请工作。

请市自来水集团加快自备井置换和老旧小区内部供水管网改造项目前期手续的办理，确保今年年底完成，为2019年度开展工作奠定基础；加快中心城区供水管网建设三期工程、四期工程，朝阳区、海淀区、丰台区供水管网完善工程建设，为2019年度计划实施自备井置换创造条件。同时，进一步落实安全责任制，确保施工过程中施工人员、周边群众及设备的安全。

特此通报。



(联系人: 魏秋成; 联系电话: 68556871、18801203750)
